


# 社会資本の復旧・復興ロードマップ 総括工程表

【問い合わせ先】  
岩手県土木整備部 河川課 (TEL 019-629-5901)

## 1 主要な海岸施設の復旧・整備 (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 防災のまちづくり)

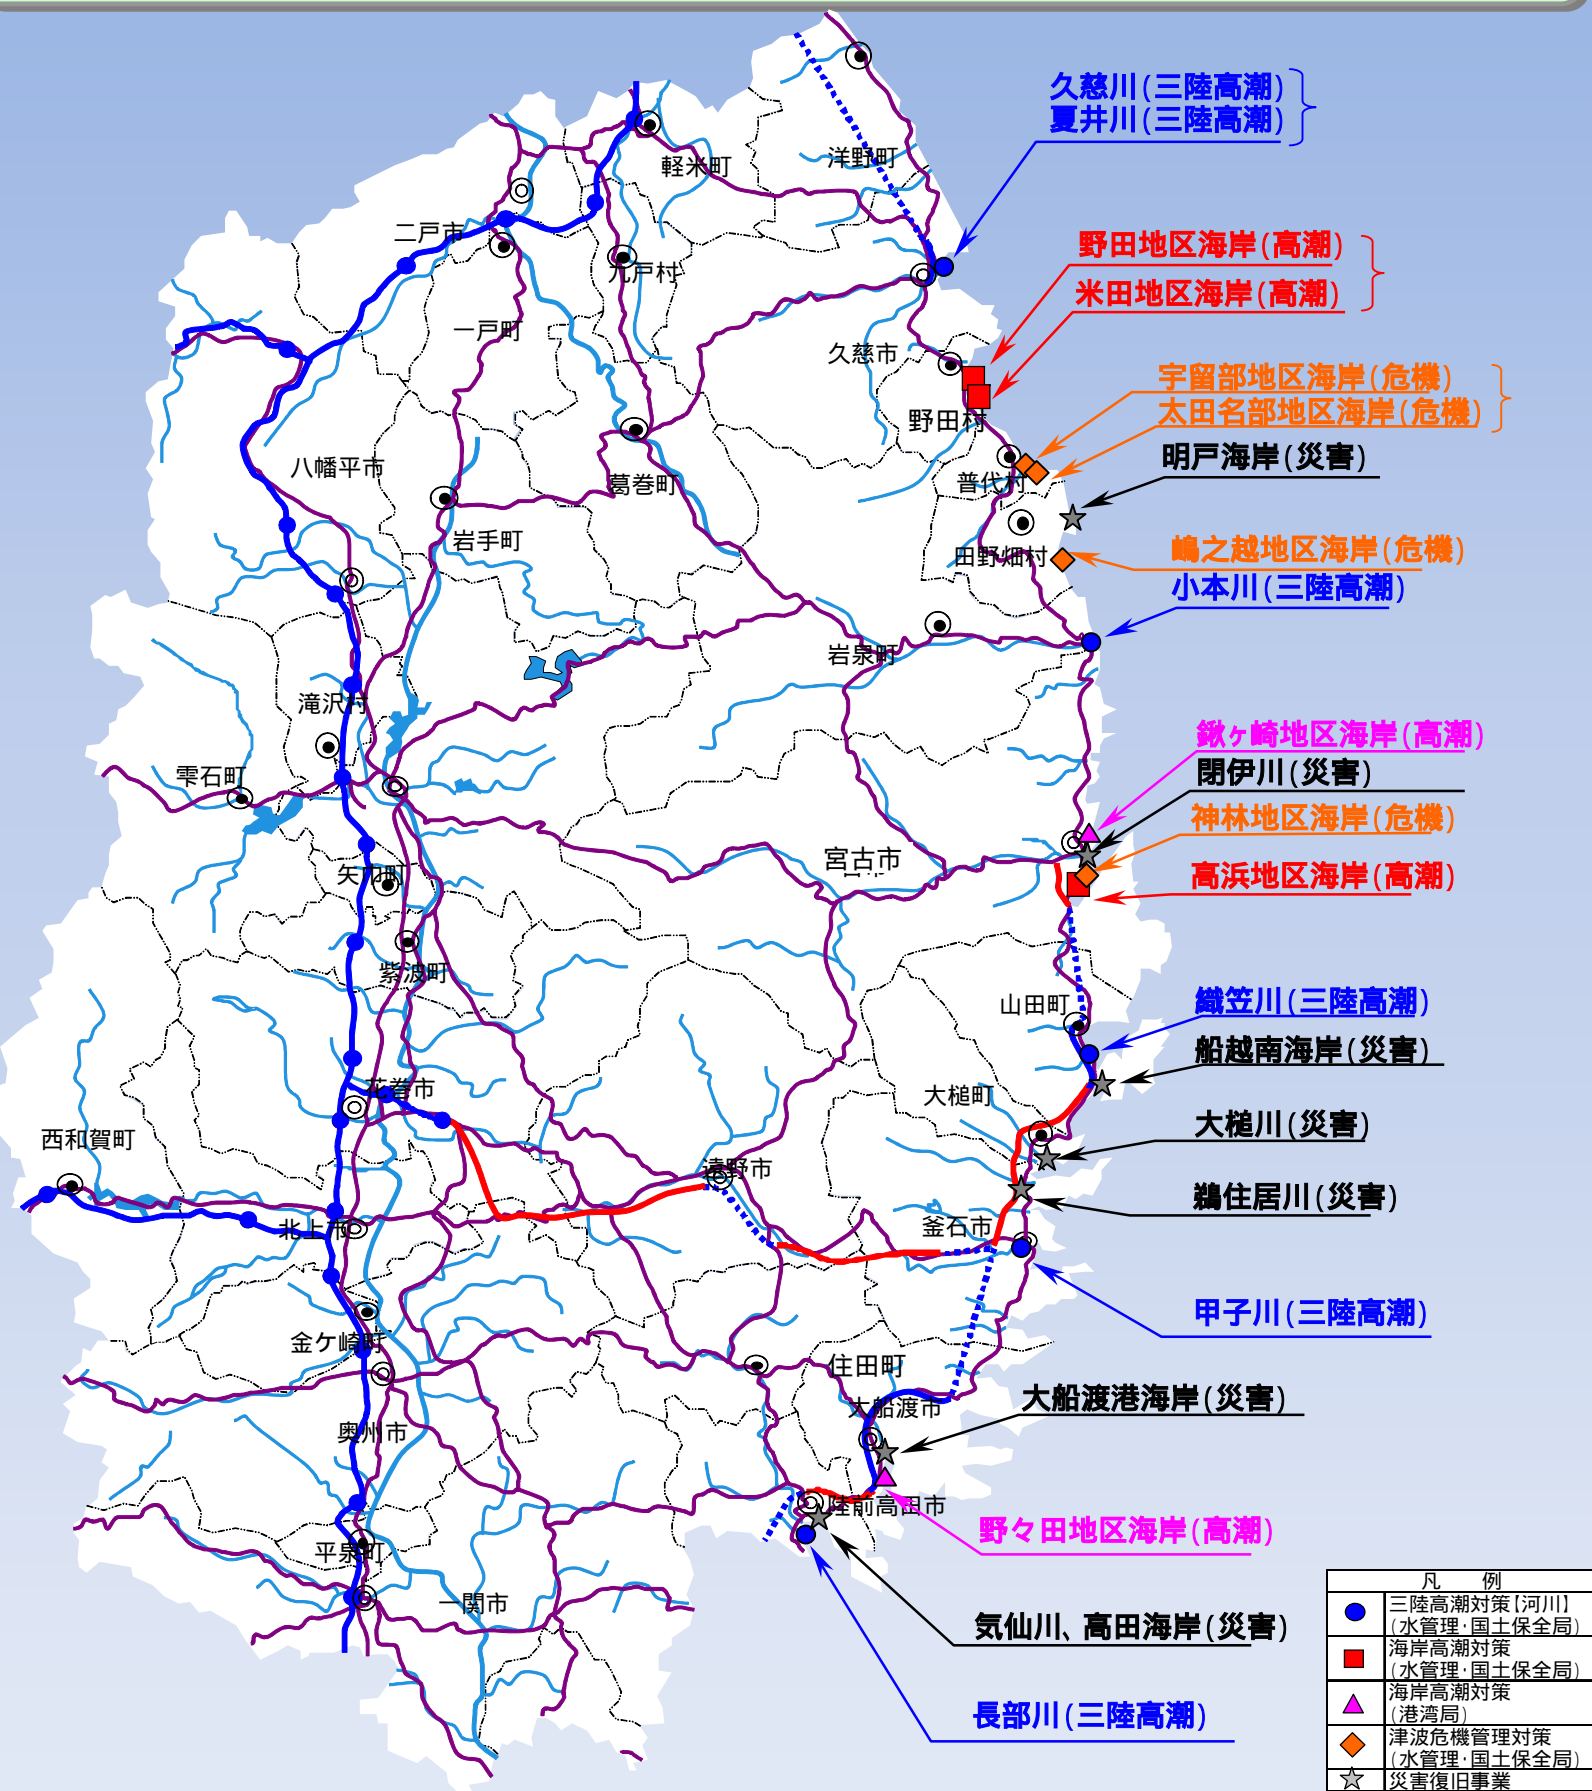

海岸対策	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岩手県の工程計画	応急対策	施工準備(堤防設計等)	堤防本復旧、新設(逐次完了し、全ての区間について概ね5年での完了を目指す。)					
54海岸で堤防・水門の復旧・新設を実施 186基の水門の機能強化を実施	水門機能強化(水門の遠隔操作化等を逐次完了し、H26年度までに78基、H30年度までには全ての完了を目指す。)							

箇所名	事業概要	年度別整備スケジュール								
		第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)		
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
久慈川 他1河川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.7km	計画堤防高の公表(10/20)	防潮堤着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤整備工事(平成27年度完成予定)					
小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤着工(上半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤整備工事(平成26年度完成予定)					
織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	計画堤防高の公表(9/26)	水門着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	水門整備工事(平成27年度完成予定)					
甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	計画堤防高の公表(10/20)	水門着工(上半期)	施工準備(堤防設計等)	水門整備工事(平成27年度完成予定)					
長部川	(三陸高潮) 水門N=1基	計画堤防高の公表(9/26)	水門着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	水門整備工事(平成27年度完成予定)					
野田地区海岸 他1海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.8km、水門等 N=2基	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤、水門着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤、水門整備工事(平成27年度完成予定)					
高浜地区海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.3km	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤整備工事(平成27年度完成予定)					
鎌ヶ崎地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=0.7km	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤着工(上半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤整備工事(平成27年度完成予定)					
野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	計画堤防高の公表(10/20)	防潮堤着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤整備工事(平成27年度完成予定)					
嶋之越地区海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、水門 等N=2基	遠隔操作化着工(H17-)		防潮堤、水門整備工事(平成25年度完成予定)						
宇留部地区海岸 他2海岸	(海岸危機) 水門等遠隔操作化N=18 基	遠隔操作化着工(H23-)		水門機能改修工事(平成27年度完成予定)						
大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、水門等 N=45基	計画堤防高の公表(10/20)	防潮堤等着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤、水門等復旧工事(平成27年度完成予定)					
明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤等着工(上半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤復旧工事(平成27年度完成予定)					
閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	計画堤防高の公表(10/20)	水門等着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	水門復旧工事(平成27年度完成予定)					
船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	計画堤防高の公表(10/20)	防潮堤着工(下半期)	応急対策	施工準備(堤防設計等)	防潮堤復旧工事(平成27年度完成予定)				
大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、水門等 N=3基	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤等着工(上半期)	応急対策	施工準備(堤防設計等)	防潮堤、水門等復旧工事(平成27年度完成予定)				
鷗住居川	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、水門等 N=4基	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤等着工(下半期)	施工準備(堤防設計等)	防潮堤、水門等復旧工事(平成27年度完成予定)					
気仙川、高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.4km、水門 N=3基	計画堤防高の公表(9/26)	防潮堤等着工(上半期)	応急対策	施工準備(堤防設計等)	防潮堤、水門等復旧工事(平成27年度完成予定)				

「事業概要」は現在の見込みであり、今後、数値を変更する可能性がある。
