


## 3 復興道路等の整備 (1/2) 【復興道路、復興支援道路】 (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 交通ネットワーク)

番号	路線名	市町村名	箇所名
<b>&lt;復興道路(県事業)&gt;</b>			
	宮古盛岡横断道路	盛岡市	築川道路
	宮古盛岡横断道路	宮古市	宮古西道路
<b>&lt;復興支援道路&gt;</b>			
1	国 106号	盛岡市	川目
2	国 107号	奥州市	札押道路
3	国 281号	岩手町	大坊
4	国 281号	久慈市	案内
5	国 283号	遠野市	上郷道路
6	国 284号	一関市	真滝BP
7	国 284号	一関市	室根BP
8	国 340号	宮古市	小国
9	国 340号	遠野市	土淵BP
10	国 340号	九戸村	泥ノ木
11	国 340号	宮古市	和井内道路
12	国 340号	軽米町	駒板
13	国 340号	住田町	山谷
14	国 342号	一関市	花泉BP
15	国 342号	一関市	白崖
16	国 343号	一関市	大原
17	国 397号	住田町	子飼沢
18	国 397号	奥州市	分限城～赤金
19	国 397号	住田町	高屋敷
20	国 397号	住田町	津付道路
21	国 397号	奥州市	小谷木橋
22	主 久慈岩泉線	岩泉町	龍泉洞
23	主 久慈岩泉線	岩泉町	大月峠
24	一 遠野住田線	遠野市	新里
25	一 水海大渡線	釜石市	女遊部

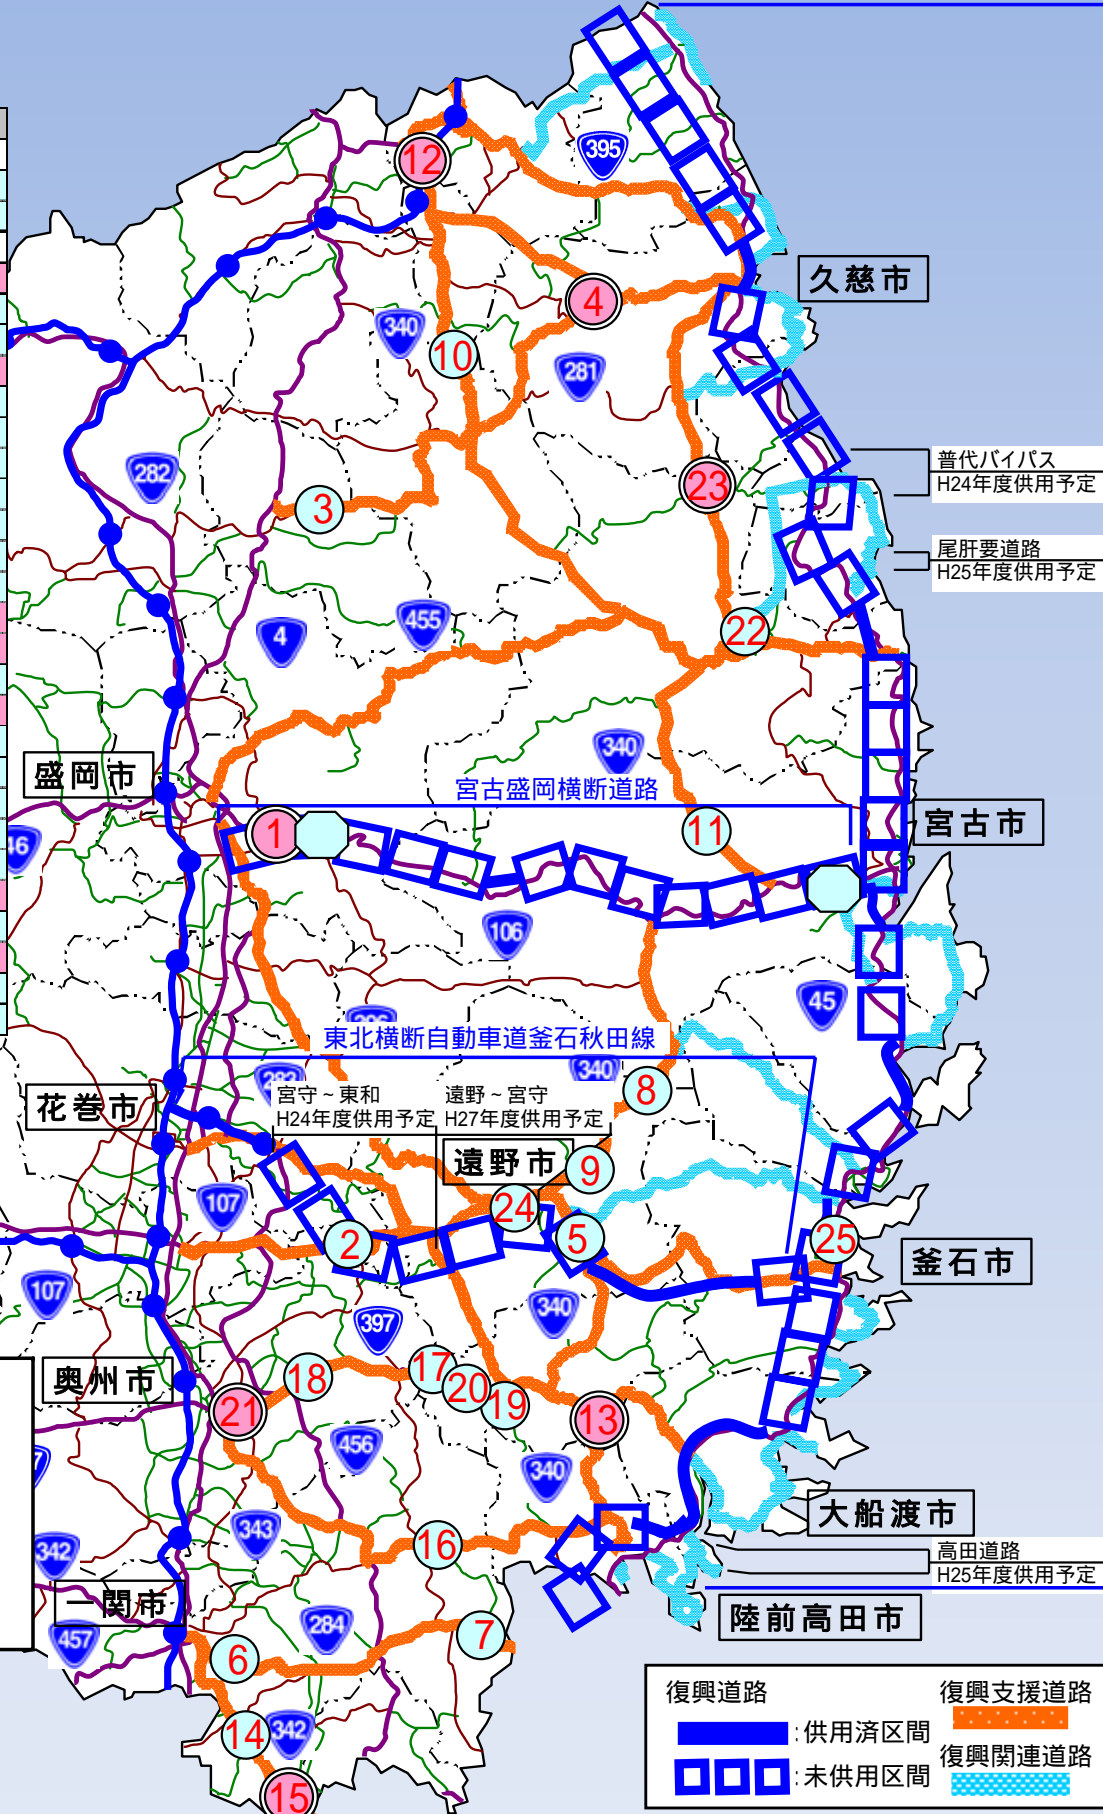

復興道路 復興支援道路  
 供用済区間 復興関連道路  
 未供用区間

改築系事業の全工区を記載。

復興道路・復興支援道路	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30
岩手県の工程計画								
1路線の2箇所まで復興道路を整備	(新規着手)	施工準備 (設計・用地等)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手(H30年度までに6箇所を供用予定)					(逐次供用開始)
12路線の25箇所まで復興支援道路を整備	(事業中)		用地・工事の推進(H30年度までに20箇所を供用予定)					(逐次供用開始)

区分	種別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール														
						第1期(基礎復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)								
						H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30							
国直轄事業	復興道路	三陸沿岸道路	-	陸前高田市 ～洋野町	-	(新規) 測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)														
		東北横断自動車道釜石秋田線	-	釜石市 ～花巻市	-	(新規) 測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)														
		宮古盛岡横断道路	-	宮古市 ～盛岡市	-	(新規) 測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手 (逐次供用開始)														
県事業	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	I	盛岡市	築川道路	(事業中)	用地・工事の進捗													
		宮古盛岡横断道路	II	宮古市	宮古西道路	(事業中)	用地・工事の進捗													
		一般国道106号 (ICへ77kmとする道路)	1	盛岡市	川目	(新規)	用地・工事の進捗													
		国道107号	2	奥州市	札押道路	(事業中)	工事の進捗													
		国道281号	3	岩手町	大坊	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道281号	4	久慈市	案内	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
		国道283号	5	遠野市	上郷道路	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道284号	6	一関市	真滝BP	(事業中)	用地・工事の進捗													
		国道284号	7	一関市	室根BP	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道340号	8	宮古市	小国	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道340号	9	遠野市	土淵BP	(事業中)	一部区間供用開始	用地・工事の進捗												
		国道340号	10	九戸村	泥ノ木	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道340号	11	宮古市	和井内道路	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道340号	12	軽米町	駒板	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
		国道340号	13	住田町	山谷	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
		国道342号	14	一関市	花泉BP	(事業中)	一部区間供用開始	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)												
		国道342号	15	一関市	白崖	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
		国道343号	16	一関市	大原	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道397号	17	住田町	子飼沢	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道397号	18	奥州市	分限城～赤金	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道397号	19	住田町	高屋敷	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道397号	20	住田町	津付道路	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		国道397号	21	奥州市	小谷木橋	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
		(主)久慈岩泉線	22	岩泉町	龍泉洞	(事業中)	用地・工事の進捗 (逐次供用開始)													
		(主)久慈岩泉線	23	岩泉町	大月峠	(新規)	施工準備(設計・用地等)	用地買収												
(一)遠野住田線 (ICへ77kmとする道路)	24	遠野市	新里	(事業中)	用地・工事の進捗															
(一)水海大渡線	25	釜石市	女遊部	(事業中)	工事の進捗															

路線、箇所は、今後、変更する可能性があります。

三陸沿岸貫通道路(岩手県内)
